Project-plan-v1.0

Casheri



Μέλη της ομάδας

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1084647: reviewer

 Δ IAΣAΚΟΣ Δ AMIANOΣ 1084632: reviewer

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 1084583: editor

ZHΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1084581: editor

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Pert chart: Microsoft Visio
Gantt chart: Team Gantt
Τεχνική Αναφορά: Word

Ορισμός Τυπικών Υποέργων

Οι υπολογισμοί είναι σε ημέρες. Επίσης θεωρήσαμε ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες χωρίς να υπολογίζουμε αργίες και σαββατοκύριακα.

TY	Τίτλος	Αισιόδοξη	Μέση	Απαισιόδοξη
		εκτίμηση	εκτίμηση	εκτίμηση
01	Καθορισμός Προδιαγραφών Έργου	4 6		8
02	Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής	2	5	7
03	Σχεδιασμός Λειτουργιών Οδηγού	4	6	8
04	Σχεδιασμός Λειτουργιών Επιβάτη	3	5	7
05	Σχεδιασμός Λειτουργιών Διαχειριστή	3	5	7
06	Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	4	5	7
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-		
07	Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων	2	3	4
08	Ανάπτυξη Λειτουργίας Login	2	3	4
09	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Register	15	20	25
10	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Register	16	18	20
11	Ανάπτυξη Dashboard Driver	14	16	18
12	Ανάπτυξη Dashboard Passenger	7	10	12
13	Ανάπτυξη Dashboard Admin	15	18	20
14	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Profile	3	4	5
15	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Profile	2	3	4
16	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Profile Edit	3	4	5
17	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Profile Edit	2	3	4
18	Ανάπτυξη Λειτουργίας My Schedule	7	10	12
19	Ανάπτυξη Λειτουργίας Social Media Feed	12	14	16
20	Ανάπτυξη Λειτουργίας Add to Schedule	8	11	12
21	Ανάπτυξη Λειτουργίας Edit Schedule	8	10	12
22	Ανάπτυξη Λειτουργίας My Posts	10	12	13
23	Ανάπτυξη Λειτουργίας Create Social Trip Post	8	10	13
24	Ανάπτυξη Λειτουργίας Preview Trips	7	10	12
25	Ανάπτυξη Λειτουργίας Request Ride	10	12	14
26	Ανάπτυξη Λειτουργίας Start Trip	10	12	14
27	Ανάπτυξη Λειτουργίας View Live Trip Route	10	12	14
28	Ανάπτυξη Λειτουργίας Navigation	12	14	16
29	Ανάπτυξη Λειτουργίας Join Social Trip Event	8	10	12
30	Ανάπτυξη Λειτουργίας Review Passengers	10	12	13
31	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver History	8	10	12
32	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger History	8	10	12
33	Ανάπτυξη Λειτουργίας Review Drivers	10	12	13
34	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Payment	12	14	18
35	Ανάπτυξη Λειτουργίας Chat	15	17	20
36	Ανάπτυξη Λειτουργίας View Users Details	8	10	12

37	Ανάπτυξη Λειτουργίας Ban User	10	12	13
38	Έλεγχος Κώδικα	25	30	35
39	Αξιολόγηση από Πελάτη	5	6	7
40	Τροποποιήσεις	10	12	14
41	Παράδοση Έργου	1	1	2

Gantt chart έργου

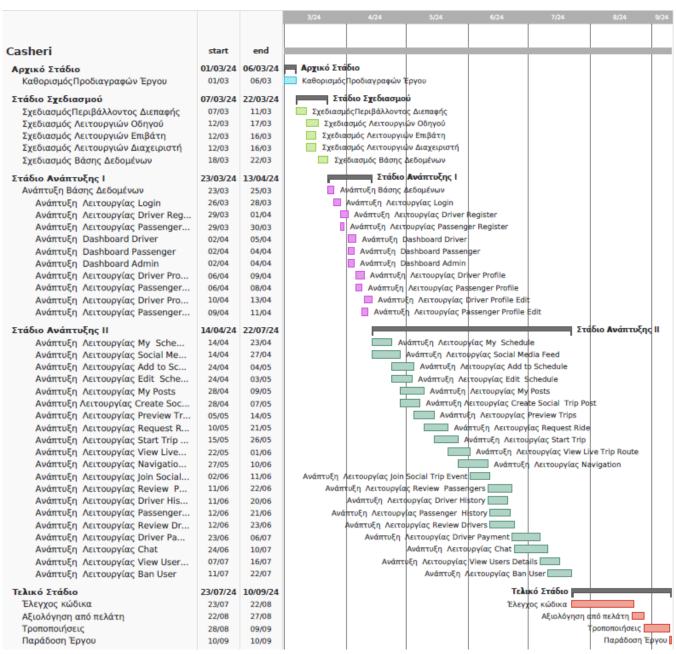


Figure 1. Gantt Chart Project Plan

Pert chart έργου

Overview

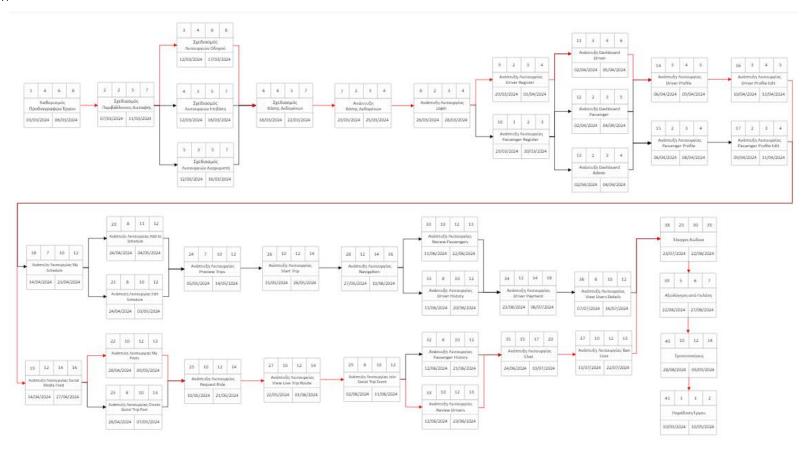


Figure 2. Pert Chart Project Plan

Part I

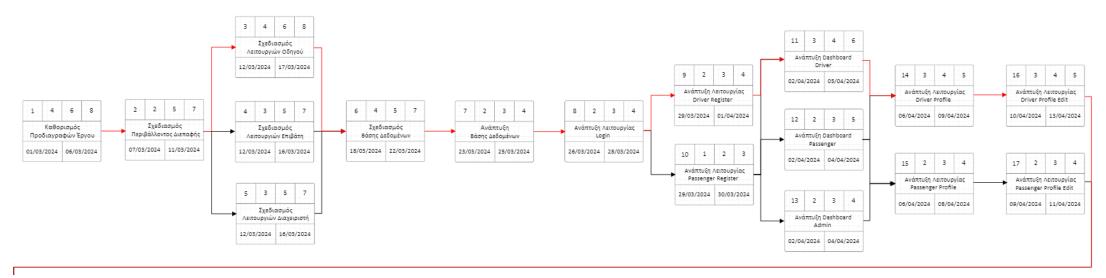


Figure 3. Pert Chart Part I

Part II

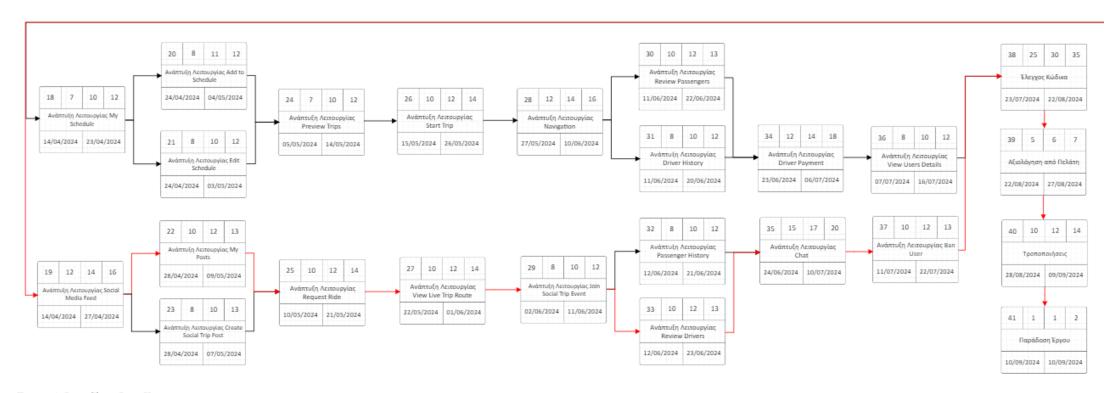


Figure 4. Pert Chart Part II

Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό

Για την πραγματοποίηση του έργου θα χρειαστούν 4 software engineers πλήρους απασχόλησης.

Οι αριθμοί στις στήλες των μηχανικών δηλώνουν το συντελεστή ενασχόλησής τους σε κάθε έργο με μέγιστο το 1 και ελάχιστο το 0.

	Τυπικό Υποέργο	engineer1	engineer2	engineer3	engineer4	ανθρωποημέρες
1	Καθορισμός Προδιαγραφών Έργου	1	1	1	1	24
2	Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής	1	1	1	1	20
3	Σχεδιασμός Λειτουργιών Οδηγού	1	1	0	0	12
4	Σχεδιασμός Λειτουργιών Επιβάτη	0	0	1	0	5
5	Σχεδιασμός Λειτουργιών Διαχειριστή	0	0	0	1	5
6	Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	1	1	1	1	20
7	Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων	1	1	1	1	12
8	Ανάπτυξη Λειτουργίας Login	1	1	1	1	12
9	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Register	1	1	0	0	6
10	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Register	0	0	1	1	4
11	Ανάπτυξη Dashboard Driver	1	1	0	0	8
12	Ανάπτυξη Dashboard Passenger	1	0	1	0	6
13	Ανάπτυξη Dashboard Admin	0	0	0	1	3
14	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Profile	1	1	0	0	8
15	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Profile	0	0	1	1	6
16	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Profile Edit	1	1	0	0	8
17	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger Profile Edit	0	0	1	1	6
18	Ανάπτυξη Λειτουργίας My Schedule	1	1	0	0	20
19	Ανάπτυξη Λειτουργίας Social Media Feed	0	0	1	1	28
20	Ανάπτυξη Λειτουργίας Add to Schedule	1	0	0	0	11
21	Ανάπτυξη Λειτουργίας Edit Schedule	0	1	0	0	10
22	Ανάπτυξη Λειτουργίας My Posts	0	0	1	0	12
23	Ανάπτυξη Λειτουργίας Create Social Trip Post	0	0	0	1	10
24	Ανάπτυξη Λειτουργίας Preview Trips	1	1	0	0	20
25	Ανάπτυξη Λειτουργίας Request Ride	0	0	1	1	24
26	Ανάπτυξη Λειτουργίας Start Trip	1	1	0	0	24
27	Ανάπτυξη Λειτουργίας View Live Trip Route	0	0	1	1	24
28	Ανάπτυξη Λειτουργίας Navigation	1	1	0	0	28
29	Ανάπτυξη Λειτουργίας Join Social Trip Event	0	0	1	1	20
30	Ανάπτυξη Λειτουργίας Review Passengers	1	0	0	0	12
31	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver History	0	1	0	0	10
32	Ανάπτυξη Λειτουργίας Passenger History	0	0	1	0	10
33	Ανάπτυξη Λειτουργίας Review Drivers	0	0	0	1	12

34	Ανάπτυξη Λειτουργίας Driver Payment	1	1	0	0	28
35	Ανάπτυξη Λειτουργίας Chat	0	0	1	1	34
36	Ανάπτυξη Λειτουργίας View Users Details	1	1	0	0	20
37	Ανάπτυξη Λειτουργίας Ban User	0	0	1	1	24
38	Έλεγχος Κώδικα	1	1	1	1	120
39	Αξιολόγηση από Πελάτη	1	1	1	1	24
40	Τροποποιήσεις	1	1	1	1	48
41	Παράδοση Έργου	1	1	1	1	4
	Σύνολο					718

Εκτίμηση κόστους

Έξοδα ανθρώπινου δυναμικού

Αμοιβή: 15 ευρώ / ώρα

Σύνολο ωρών = Ανθρωποημέρες * 8 ώρες = 718 * 8 = 5744 ώρες

Έξοδα μισθών = Αμοιβή * Σύνολο ωρών = 15 * 5744 = 86160 ευρώ

Έξοδα λειτουργικά

Google Map API license: 200 ευρώ / μήνα * 6 μήνες = 1200 ευρώ

Υπηρεσίες cloud: 100 ευρώ / μήνα * 6 μήνες = 600 ευρώ

Ενοίκιο: 800 ευρώ / μήνα * 6 μήνες = 4800 ευρώ

Λογαριασμοί: 150 ευρώ / μήνα * 6 μήνες = 900 ευρώ

Λογιστικά: 5000 ευρώ

Έξοδα εξοπλισμού

Υπολογιστές: 4 υπολογιστές * 1500 ευρώ = 6000 ευρώ

Εξοπλισμός γραφείων: 1000 ευρώ

Διάφορα: 400 ευρώ

Σύνολο εξόδων

Έξοδα: 106960 ευρώ
